No.		市町村	東通村

汚水処理整備区域図　　目標年次

■目標年次	令和23年度

■手法毎の汚水処理整備区域

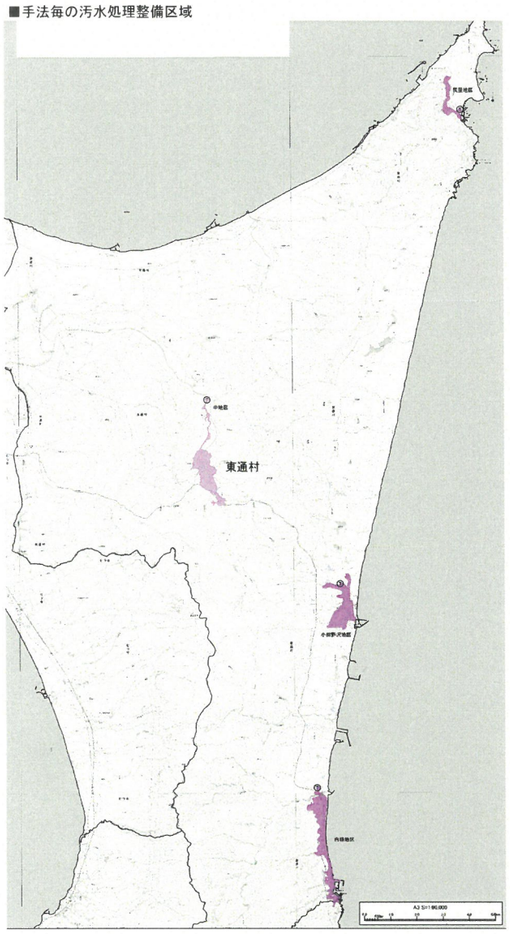

既整備区域	アクションプラン	計画区域	事業種別
赤	赤	赤	公共下水道事業
橙	橙	橙	流域関連公共下水道事業
スミレ	スミレ	スミレ	特定環境保全公共下水道事業
青	青	青	農業集落排水事業
黄緑	黄緑	黄緑	小規模集合排水処理施設整備事業
紫	紫	紫	漁業集落排水事業
	T		処理場
実行メニュー（運営管理）	→	⇢	施設の統廃合（実績/計画）
	→	⇢	維持管理・事務の共同化（実績/計画）

■整備計画

①課題の整理

課題1	村内浄化センター(4施設)が老朽化しており、高額な更新費用が見込まれているとともに人口減少による施設の余裕が増大している。
課題2	
課題3	
課題4	

②スケジュール

計画区分	事業	事業内容	12 令和8年	17 令和13年	22 令和18年	27 令和23年
実行メニュー（運営管理）	共通	中地区浄化センター改修				
		尻屋浄化センター改修				
		白糠浄化センター改修				
		小田野沢浄化センター改修				

③目標、概算事業費等

			全体	公共下水道	集落排水施設・コミプラ	浄化槽		備考
						個人設置型	市町村設置型	
整備手法	R13	整備人口（人）	3,935	660	2,248	1,027		
		整備面積（集合処理分）(ha)	235	69	166			
		日最大汚水量（m3/日）	1,589	746	843			
		計画汚泥量（t-DS/日）	0.1	0.03	0.05			
	R23	整備人口（人）	3,760	660	1,771	1,329		
		整備面積（集合処理分）(ha)	235	69	166			
		日最大汚水量（m3/日）	1,410	746	664			
		計画汚泥量（t-DS/日）	0.1	0.03	0.04			
ベンチマーク（指標）	経費回収率（%）		1	90	90			
			0					
			0					
概算事業費	総建設事業費(百万円)		13,598	2,760	5,857	4,981		
	年間維持管理費（百万円/年）		94	33	61	0		
実施メニュー	施設の統廃合		－					
	処理施設のダウンサイジング		－					
	維持管理・事務の共同化		－					
	省エネ・再エネに向けた取り組み		－					
	その他（　　）		－					
